HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Názov spoločnosti: Padala a spol. s.r.o,

Názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská, 1. sc , UO00461

Stavby vedúci: Gustáv Macek

Stavebný dozor investora: Peter Páleš

Dátum spracovania: 19.2.2020
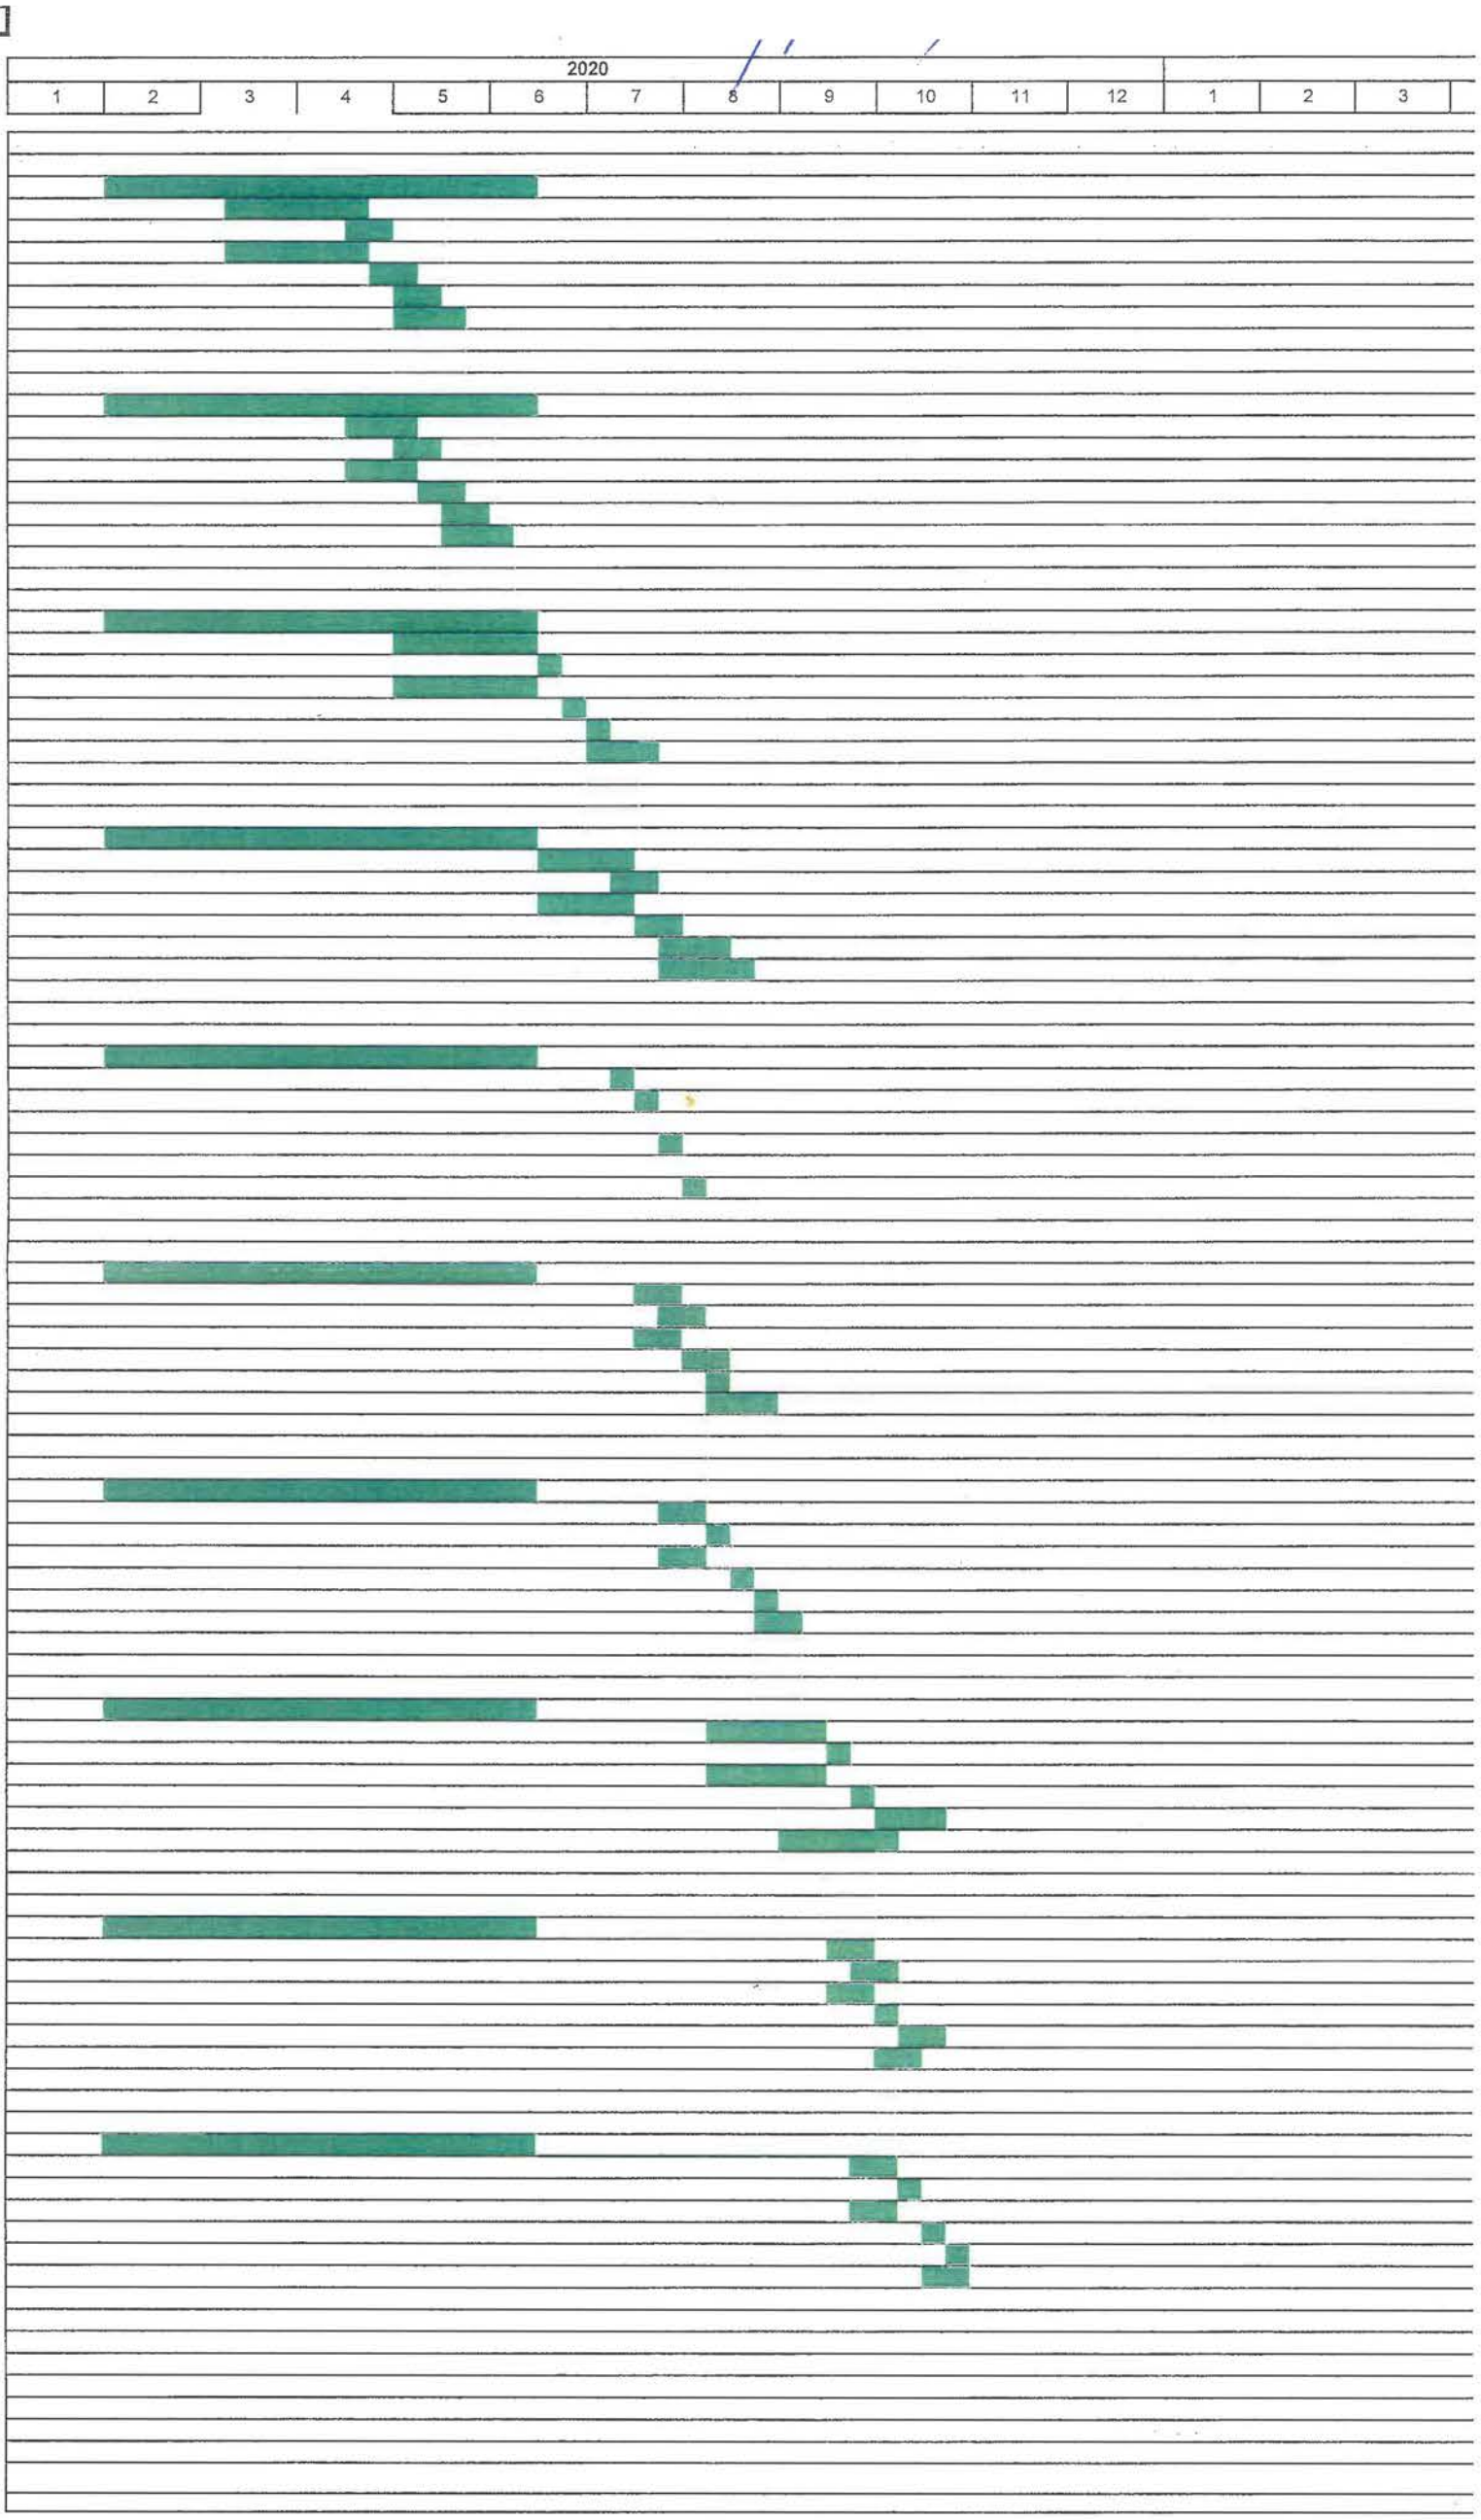
Názov stavby, objektu, časti	vyplniť od	vyplniť do
Vetva "A" ul. Kpt. Nálepku		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	16.3.2020	21.4.2020
Skúšky	22.4.2020	28.4.2020
Zemné a montážne práce prípojky	16.3.2020	21.4.2020
Realizácia prepojov/odpojov	29.4.2020	6.5.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	7.5.2020	12.5.2020
Povrchové úpravy	7.5.2020	20.5.2020
Odovzdanie		
Vetva "B" ul. Štúrova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	22.4.2020	6.5.2020
Skúšky	7.5.2020	15.5.2020
Zemné a montážne práce prípojky	22.4.2020	6.5.2020
Realizácia prepojov/odpojov	14.5.2020	20.5.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	21.5.2020	25.5.2020
Povrchové úpravy	21.5.2020	5.6.2020
Odovzdanie		
Vetva "C" ul. Štúrova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	7.5.2020	16.6.2020
Skúšky	17.6.2020	23.6.2020
Zemné a montážne práce prípojky	7.5.2020	16.6.2020
Realizácia prepojov/odpojov	24.6.2020	30.6.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	1.7.2020	3.7.2020
Povrchové úpravy	1.7.2020	24.7.2020
Odovzdanie		
Vetva "D" ul. Sládkovičova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	17.6.2020	14.7.2020
Skúšky	15.7.2020	21.7.2020
Zemné a montážne práce prípojky	17.6.2020	14.7.2020
Realizácia prepojov/odpojov	22.7.2020	28.7.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	29.7.2020	14.8.2020
Povrchové úpravy	29.7.2020	21.8.2020
Odovzdanie		
Vetva "E" ul. Štúrova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	15.7.2020	17.7.2020
Skúšky	20.7.2020	24.7.2020
Zemné a montážne práce prípojky		
Realizácia prepojov/odpojov	27.7.2020	31.7.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ		
Povrchové úpravy	3.8.2020	7.8.2020
Odovzdanie		
Vetva "F" ul. Štúrova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	20.7.2020	29.7.2020
Skúšky	30.7.2020	5.8.2020
Zemné a montážne práce prípojky	20.7.2020	29.7.2020
Realizácia prepojov/odpojov	6.8.2020	12.8.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	13.8.2020	14.8.2020
Povrchové úpravy	13.8.2020	28.8.2020
Odovzdanie		
Vetva "G" ul. Štúrova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	30.7.2020	7.8.2020
Skúšky	10.8.2020	14.8.2020
Zemné a montážne práce prípojky	30.7.2020	7.8.2020
Realizácia prepojov/odpojov	17.8.2020	21.8.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	24.8.2020	25.8.2020
Povrchové úpravy	24.8.2020	4.9.2020
Odovzdanie		
Vetva "H" ul. Hviezdoslavova, Štefánikova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	10.8.2020	14.9.2020
Skúšky	16.9.2020	22.9.2020
Zemné a montážne práce prípojky	10.8.2020	14.9.2020
Realizácia prepojov/odpojov	23.9.2020	29.9.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	30.9.2020	23.10.2020
Povrchové úpravy	7.9.2020	2.10.2020
Odovzdanie		
Vetva "I" ul. Hviezdoslavova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	16.9.2020	25.9.2020
Skúšky	28.9.2020	2.10.2020
Zemné a montážne práce prípojky	16.9.2020	25.9.2020
Realizácia prepojov/odpojov	5.10.2020	9.10.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	12.10.2020	20.10.2020
Povrchové úpravy	5.10.2020	16.10.2020
Odovzdanie		
Vetva "J" ul. Štúrova		
Príprava, vytýčenie	4.2.2020	15.6.2020
Zemné a montážne práce plynovod	28.9.2020	9.10.2020
Skúšky	12.10.2020	16.10.2020
Zemné a montážne práce prípojky	28.9.2020	9.10.2020
Realizácia prepojov/odpojov	19.10.2020	23.10.2020
Montáž OPZ a prepoje OPZ	26.10.2020	30.10.2020
Povrchové úpravy	19.10.2020	31.10.2020
Odovzdanie		
Iné		
iné...		
iné...		
iné...
